


Bauarbeiten Reservoir Eich und Werkleitungsbau

Aktueller Stand der Bauarbeiten

10. April 2025


Die generelle Wasserversorgungsplanung der Gemeinde Hölstein sieht mehrere Massnahmen zur Verbesserung der Trink und Löschwasserversorgung der drei Hochzonen Buechring, Finelen und Stutz vor. Die drei umfassendsten und für die Versorgung mit Löschwasser, sowie die Versorgungssicherheit wichtigsten Massnahmen werden umgesetzt:

- Neubau Reservoir Eich mit Abbruch des bestehenden Reservoirs
- Werkleitungsanschluss des neuen Reservoirs an die Hochzone Buechring im Bereich Holenweg inkl. Instandstellung Holenweg ausserhalb des Siedlungsgebietes
- Erstellung zweite Leitungsverbindung (Ringschluss) ab dem neuen Reservoir Eich bis Biretenweg (Bereich Hof Obere Bireten)

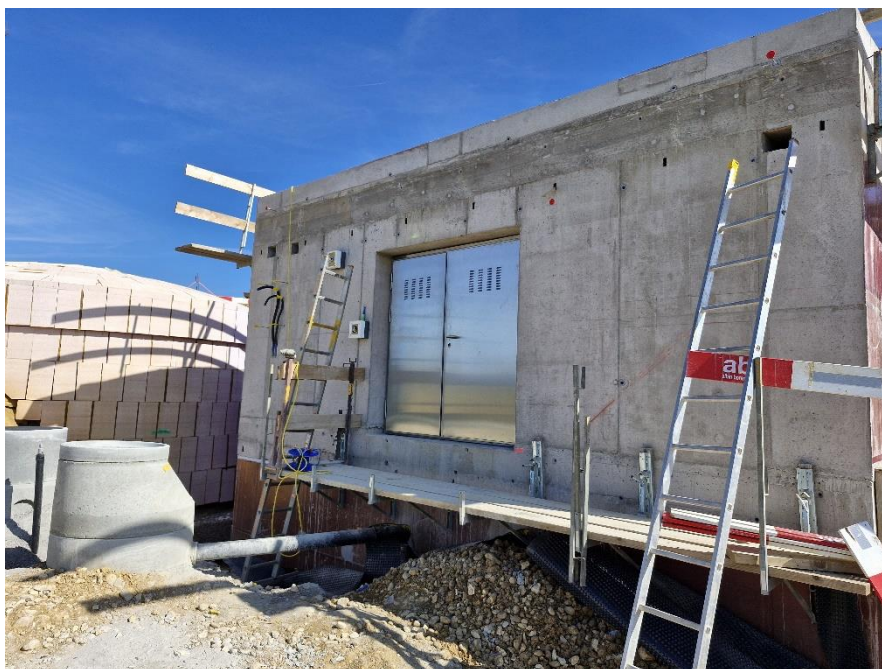

Die Bauarbeiten für das Reservoir Eich schreiten weiter voran. Die Innenausbauarbeiten (Montage Edelstahlteile, Elektroarbeiten, Malerarbeiten, Reinigung) sind zu einem grossen Teil fertiggestellt. Nach Abschluss der Innenausbauarbeiten erfolgt die Umfassende Dichtigkeitsprüfung der Reservoirkammern.

Mit den Umgebungsarbeiten soll nach erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung begonnen werden. Konkret umfasst dies die Hinterfüllung des Reservoirs. Die Inbetriebnahme des Reservoirs ist für die zweite Hälfte Juli 2025 geplant. Anschliessend erfolgt der Rückbau des alten Reservoirs.

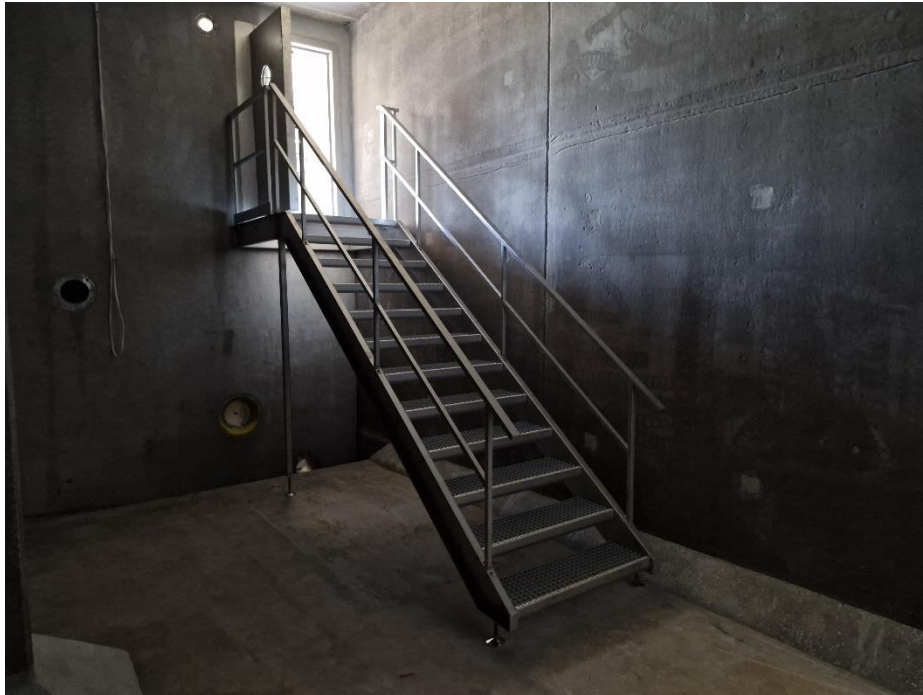

Der Beginn der Spezialtiefbauarbeiten 2. Etappe (Ringschluss) ist, nach Freigabe durch die bodenkundliche Baubegleitung ab Anfang Juni 2025 vorgesehen.

Gerne halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Bauunternehmung und Bauleitung werden bemüht sein, Einschränkungen jeglicher Art so gering wie möglich zu halten.

Gemeinde Hölstein
